

FICHE BILAN
FONDS DE TRAVAUX URBAINS (FTU)
VILLE DE ROUBAIX

QUARTIER CONCERNE : Est - Ouest x Nord - Sud - Centre

TITRE DU PROJET :

Référence du projet : Sécuriser l'allée du Jardin Chlorophylle

REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : Meriem LAHMIDI

SERVICE DESTINATAIRE DE LA SUBVENTION FTU :

| Nom du Service municipal | Adresse | Téléphone et E-mail |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| MQN | 14 Place de la Fosse aux Chênes | |

LIEU DE REALISATION :

Jardin de Chlorophylle 315 grand rue

OBJECTIFS INITIAUX DU PROJET :

- Permettre un accueil dans de meilleures conditions;
- Permettre l'accès aux PMR ;

DEROULEMENT DETAILLE DU PROJET :

Le projet a consisté à effectuer des travaux afin d'améliorer l'accueil :

- Démontage du plancher existant avec évacuation des déchets
- Prise de niveau, implantation, terrassement et mise à niveau du fond de coffre
- Dépose des bordures existante et création d'un bateau accès PMR
- Réalisation d'un ternaire avec compactage
- Réalisation d'un coffrage bois et mise en place d'un treillis soudé
- Mise en œuvre d'un béton pour finaliser l'allée

Le jardin Chlorophylle a refait complètement l'accès au bâtiment, et ce en le réalisant dans un matériau non glissant (béton désactivé) et répondant aux normes PMR en vigueur (stabilisation, pente, bordure chasse-roues, et largeur).

La nouvelle allée facilite donc l'accès aux personnes à mobilité réduite et elle permet d'accueillir les publics en toute sécurité.

MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET :

Le calendrier n'a été respecté, les travaux n'ont pas pu être réalisés au printemps comme prévu. L'association ARI a pris du retard dans la réalisation des chantiers.

ORIGINES ET CAUSES :

L'association souhaitait remplacer l'allée menant au bâtiment principal du site. L'allée était faite à partir de plancher en bois. Les conditions météorologiques ont détérioré le bois qui a pourri (décalage, affaissements par endroit, lames cassées).

De plus les jours de pluies le bois, le plancher était glissant, ce qui rendait l'allée dangereuse pour les publics et tout particulièrement pour les enfants qui sont nombreux à fréquenter le site.

PARTENAIRES ASSOCIES :

Le service développement durable, la MQN, le service petite enfance

NOMBRE D'HABITANTS MOBILISES POUR METTRE EN ŒUVRE LE PROJET :

Les usagers du jardin Chlorophylle ont été concertés.

EVALUATION DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS INITIAUX, RESULTATS OBTENUS (points positifs, difficultés, rencontrées, moyens mis en place pour y remédier...) :

Aspects positifs : Site répondant aux normes de sécurité

Aspects négatifs :

Remarques/informations complémentaires : Les habitants trouvent que le site a été embelli et est plus convivial.


CALENDRIER DU PROJET REALISE :

Réalisation de l'allée en septembre

PHOTOS DU SITE AVANT TRAVAUX :



PHOTOS DU SITE APRES TRAVAUX :

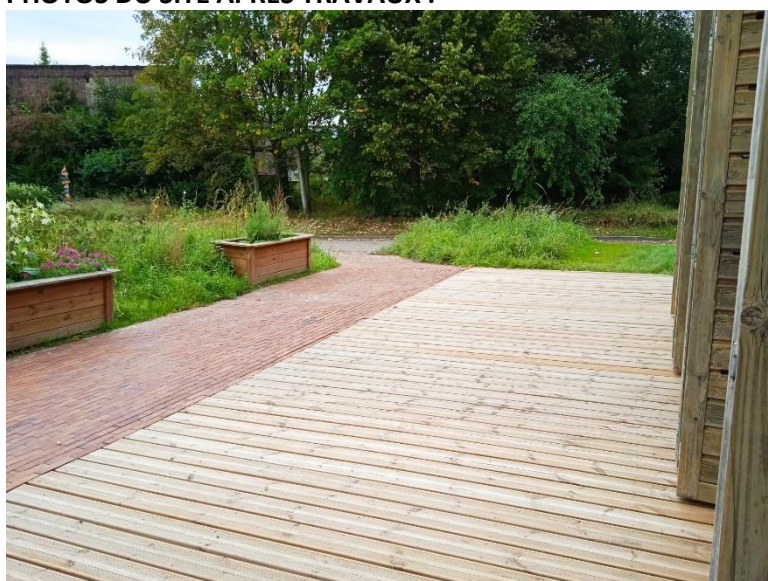

DATE D'ACHEVEMENT DU PROJET FTU :

01/06/2021

BUDGET REALISE DU PROJET

| DEPENSES | | | RECETTES | | |
|--|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| | Montant HT | Montant TTC | | Montant HT | Montant TTC |
| Achat : Matières et Fournitures | 11380 | 11380 | Ville : MQN | 6807 | 6807 |
| Services extérieurs : Location Entretien Maintenance Déplacements | | | Conseil Régional : | 4573 | 4573 |
| Charges de personnel | | | Autres recettes : | | |
| Autres frais | | | Ressources propres : | | |
| TOTAL | 11380 | 11380 | TOTAL | 11380 | 11380 |

| | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|--|
| Temps bénévoles | | Bénévolat | |
| Autres (à préciser) | | Dons | |
| Total des valorisations | | Total des valorisations | |

| | |
|---|-----------------------------|
| SIGNATURE DU REFERENT TECHNIQUE DU PROJET : MERIEM LAHMIDI | Fait à Roubaix, le 18/11/21 |
|---|-----------------------------|

**CADRE RESERVE AU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU
RELEVÉ DE DECISION DU COMITE DE GESTION URBAINE DU FTU**

BILAN DU PROJET FTU

QUARTIER CONCERNE : Est - Ouest - Nord - Sud - Centre

Date du Comité de Gestion Urbaine du FTU :

Date de dépôt de la demande de subvention FTU :

TITRE DU PROJET :

Référence du projet : FTU /...../...../.....

NOM ET ADRESSE DE L'ATTRIBUTAIRE :

DECISION DU CGU DU FTU :

Favorable

Défavorable

A représenter (avec les éléments suivants) :

.....

Montant de la subvention FTU accordé : euros (Total)

Montant de l'acompte FTU accordé : euros

Montant du solde FTU accordé : euros

Montant total de la subvention FTU reçu : euros

LE DEROULEMENT DE L'ACTION EST CONFORME AU PROJET PRESENTE : OUI NON

.....

LA FICHE BILAN EST COMPLETE ET FOURNIT SUFFISAMMENT D'INFORMAION POUR RENDRE COMPTE DU PROJET : OUI A COMPLETER

.....

LE MONTANT ACCORDE PAR LE FTU EST JUSTIFIE PAR DES FACTURES CONFORMES : OUI NON

.....

LE BUDGET EST DETAILLE ET EQUILIBRE (SOUS RESERVE DE VERIFICATION DU BUDGET) : OUI NON

.....

REMARQUES/OBSERVATIONS/CONDITIONS DE VERSEMENT :

.....

Le –La Président(e) de séance
du Comité de Gestion Urbaine du FTU :
Signature



Association A.R.I

57 AVENUE JULES BRAME

59100 ROUBAIX

Tél : +33 3 20 83 20 81

Mail : contact@grandanglesiae.fr

SIRET : 43863675500029

IBAN FR76 1562 9027 2800 0397 0694 043
CCM ROUBAIX LECLERC BIC CMCIFR2A

Facture N°

21/143

Date

30/06/2021

Client

CL0113

Mairie de Quartier Nord

14 Place de la Fosse aux Chênes

59100 Roubaix

| Désignation | Quantité | P.U. HT | Montant HT | TVA |
|--|----------|---------|------------|-----|
| Lettre de commande du 8 Décembre 2020 N° Engagement A220 20200008 | | | | |
| Demandeur : Elise GASSIAT-HENU | | | | |
| Objet : Création accès accueil | | | | |
| Lieux d'intervention : Jardin chlorophylle - 59100 ROUBAIX | | | | |
| Démontage du plancher existant avec évacuation des déchets | 152,000 | 12,00 | 1 824,00 | 0 |
| Prise de niveau & implantation | | | | |
| Terrassement et mise à niveau du fond de coffre | 30,000 | 45,00 | 1 350,00 | 0 |
| Dépose des bordures existantes et création d'un bateau accès PMR | 1,000 | 254,00 | 254,00 | 0 |
| Réalisation d'un ternaire à 150KG (fond de forme), avec compactage à la plaque vibrante | 23,000 | 28,00 | 644,00 | 0 |
| Réalisation d'un coffrage bois & mise en place d'un treillis soudé | | | | |
| Mise en oeuvre d'un béton C25/30 lissée au règle alu et passage d'une carotte vibrante pour éliminé toutes bulle d'air, finition taloché | 116,000 | 63,00 | 7 308,00 | 0 |
| Mise en oeuvre d'un désactiveur de béton sur la surface du béton avec mise en place d'un polyane de protection. | | | | |
| Le lendemain passage d'un karcher HP pur la création du béton désactivé. | | | | |
| Nettoyage & repli de chantier | | | | |

ASSOCIATION LOI 1901 NON ASSUJETTIE A LA TVA

| Code | Base HT | Taux TVA | Montant TVA |
|------|-----------|----------|-------------|
| 0 | 11 380,00 | | |

| | |
|--------------------|------------------|
| Total HT | 11 380,00 |
| Net HT | 11 380,00 |
| Total TVA | |
| Total TTC | 11 380,00 |
| NET A PAYER | 11 380,00 |

Facture payable le 31/07/2021 pour la somme de 11 380,00 Euros par chèque/ virement.

Remarque : Devis - ACI/20/190 du 18/11/2020

Pénalités de retard (taux annuel) : 10,00% - Escompte pour paiement anticipé (taux mensuel) : 1,50%

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40,00 €

RESERVE DE PROPRIETE : Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement du prix par l'acheteur. Notre droit de revendication porte aussi bien sur les marchandises que sur leur prix si elles ont déjà été revendues (Loi du 12 mai 1980).
